



**ZACATECAS**  
PATRIMONIO MUNDIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN

**ACTA  
ENTREGA – RECEPCIÓN**

**PROGRAMA: RAMO GENERAL 33, FONDO DE APORTACIONES  
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
2019.**

**PROGRAMA:** SH VIVIENDA DIGNA

**SUBPROGRAMA:** 03 OA CONSTRUCCION URBANA

**No. DE OBRA:**

**No. DE CONTRATO:** PMZ-FISM-20/2019

EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE, SIENDO LAS 11:00 A.M. HORAS DEL DÍA 24 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE 300 M2 DE TECHO FIRME PARA 12 VIVIENDAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS"

PDBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZADA		
MUJERES	HOMBRES	HOGARES	MUJERES	HOMBRES	HOGARES
25	5	12	25	5	12
METAS DEL PROYECTO: 300 M2			ALCANZADAS: 300 M2		

LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ESTATALES, CUYOS NOMBRES, FIGURAS Y REPRESENTACIONES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, ASI COMO EL L.A.E. EDUARDO ROBERTO ORTEGA LÓPEZ VITAL, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ACQUA, S DE R. L. DE C.V.

ADEMAS DE LOS BENEFICIARIOS A TRAVES DE SU COMITE DE OBRA, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

PATRIMONIO MUNDIAL  
H A Y U N T A M I E N T O 2 0 1 8 - 2 0 2 1



# ZACATECAS

PA TR I M O N I O M U N D I A L

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN

### DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DESMONTAJE DE LAMINAS, CADENAS DE CERRAMIENTO, SALIDA PARA CENTRO INCANDESCENTE Y CONTACTO, LOSA ALIGERADA CON CASETON, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, APLANADO CON YESO EN PLAFOND, PRETILES, ENTORTADO E IMPERMEABILIZANTE.

### PERIODO DE EJECUCION CONTRATADO DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DEL 2019  
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

### PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 06 DE ENERO DE 2020  
FECHA DE TERMINACION: 29 DE FEBRERO DEL 2020

### LAS CAUSAS QUE RETRASARON LA TERMINACION DE LA OBRA FUERON:

ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO Y TRABAJOS ADICIONALES

MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO
\$575,338.47	\$575,338.47

### RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS:

No. DE ESTIMACION	MONTO	PERIODO DE EJECUCION
1	\$287,669.22	DEL 06/ENE/20 AL 07/FEB/20
2	\$287,669.25	DEL 08/FEB/20 AL 29/FEB/20
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 575,338.47</b>	

P A T R I M O N I O M U N D I A L  
H . A Y U N T A M I E N T O 2 0 1 8 - 2 0 2 1



# ZACATECAS

PATRIMONIO MUNDIAL  
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN

### RELACION DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE AUTORIZACION:

No. DE ESTIMACION	MONTO	PERIODO DE EJECUCION
NINGUNA	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>		

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA PARA SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA HACE ENTREGA EN ESTOS MOMENTOS DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL DE LA OBRA, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA EXHIBE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCICIO, PARA RESPONDER DE VICIOS OCULTOS O TRABAJOS MAL EJECUTADOS DE LA OBRA, Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, Y ESTARAN GARANTIZADOS POR UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, ANEXANDOSE PARA CONSTANCIA COPIA FOTOSTATICA.

### DATOS DE LA FIANZA DEPOSITADA PARA VICIOS OCULTOS:

NUMERO DE LA FIANZA: **457-18603-2**

MONTO DE LA FIANZA: **\$ 57,533.85**

NOMBRE DE LA AFIANZADORA QUE LA EXPIDE: **ASEGURADORA INSURGENTES**

FECHA: **29 DE FEBRERO DE 2020**

PATRIMONIO MUNDIAL  
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021



**ZACATECAS**

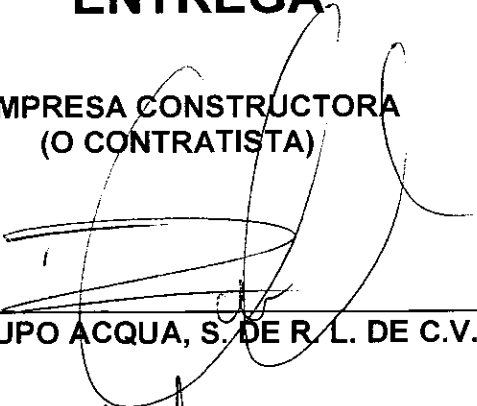
PATRIMONIO MUNDIAL  
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN

**POR MEDIO DE ESTA ACTA EL CONTRATISTA HECE ENTREGA DE LA OBRA AL  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZACATECAS Y BENEFICIARIOS DE LA MISMA, QUIENES  
SERAN LOS RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**

## **ENTREGA**

**EMPRESA CONSTRUCTORA  
(O CONTRATISTA)**

  
\_\_\_\_\_  
**GRUPO ACQUA, S. DE R. L. DE C.V.**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ARQ. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**

**SUPERVISOR**

**Vo. Bo.**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. ALONSO ARTURO ENRIQUEZ ORTEGA**  
ENCARGADO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPALES

PATRIMONIO MUNDIAL  
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021



**ZACATECAS**

PATRIMONIO MUNDIAL

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN

## INVITADOS

CONTRALORIA MUNICIPAL

REPRESENTANTE

SEDESOL MUNICIPAL

REPRESENTANTE

SEDESOL ESTATAL

REPRESENTANTE

PATRIMONIO MUNDIAL

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

Av. Héroes de Chapultepec No. 110 Col. Lázaro Cárdenas. Zacatecas, Zac. C.P. 98040 TEL. 923 94 21 Ext. 1662



ZACATECAS

PATRIMONIO MUNDIAL  
- AYUNTAMIENTO 2014 - 2017

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN

## BENEFICIARIOS

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

PATRIMONIO MUNDIAL  
AYUNTAMIENTO 2015 - 2021
